

都 市 開 発 株 式 会 社 殿

小樽港第3号埠頭道路舗装撤去工事

平成 19 年 11 月

品質管理試験報告書

 H.R.S 北海道調査測量株式会社

本社 / 〒047-0005 小樽市勝納町8番39号

TEL : 0134-22-7710

FAX : 0134-22-7696

E-mail : hrs@seagreen.ocn.ne.jp

営業所 / 〒063-0826 札幌市西区発寒9条13丁目737番1-8  
駅前プラザ発寒2F・H

TEL : 011-667-0385

はじめに

このたび、貴社御依頼の施工管理試験結果がまとまりましたので、

御報告申し上げます。

関係各位に厚く御礼申し上げます。

又、御質問、お問い合わせ等がございましたら御遠慮なく申し付け下さい。

小樽市勝納町8番39号  
北海道調査測量株式会社

試験責任者 竹内 雅 啓

TEL(0134)22-7710

FAX(0134)22-7696

Eメール hrs@seagreen.ocn.ne.jp

# 試 驗 結 果

フルイ分け・洗い試験結果

測 点	粗 粒 率	洗 い 損 失 量 (%)	
		(1)	(2)
現場内採取	6.40	2.23	9.50

洗い損失量

(1) 75 $\mu$ を通過する量の全量に対する百分率

(2) 75 $\mu$ を通過する量の4750 $\mu$ を通過する量に対する百分率

# デ ー タ ー 集


試料名 現場内採取

採取日 : 平成19年11月19日

フルイ目の呼び寸法 (mm)	残留重量 (g)	残留率 (%)	加積残留率 (%)	加積通過率 (%)
106				
※ 75				
63				
53	0	0	0	100
※ 37.5	1045	6	6	94
31.5	1526	9	15	85
26.5	1891	11	26	74
※ 19	2554	15	41	59
16	1078	6	47	53
13.2	1028	6	53	47
※ 9.5	1460	9	62	38
※ 4.75	2189	13	75	25
※ 2.36	1493	9	84	16
※ 1.18	697	4	88	12
※ 0.6	713	4	92	8
※ 0.3	415	3	95	5
※ 0.15	249	2	97	3
0.075	100	1	98	2

試料重量 = 16587 g 粗粒率 = 6.40

測定番号	1	2
A 洗う前の乾燥重量 (g)	5241	5301
B 洗った後4750 $\mu$ mに とどまった乾燥重量(g)	4027	4041
C 洗った後4750 $\mu$ mを通 過し75 $\mu$ mにとどまった 乾燥重量 (g)	1099	1140
D 75 $\mu$ mを通過した乾燥 重量 A-(B+C) (g)	115	120
(1) 75 $\mu$ mを通過する量の 全量に対する百分率 D/A $\times$ 100 (%)	2.19	2.26
平 均 値 (%)	2.23	
(2) 75 $\mu$ mを通過する量の 4750 $\mu$ mを通過する量に対す る百分率 D/(A-B) $\times$ 100 (%)	9.47	9.52
平 均 値 (%)	9.50	

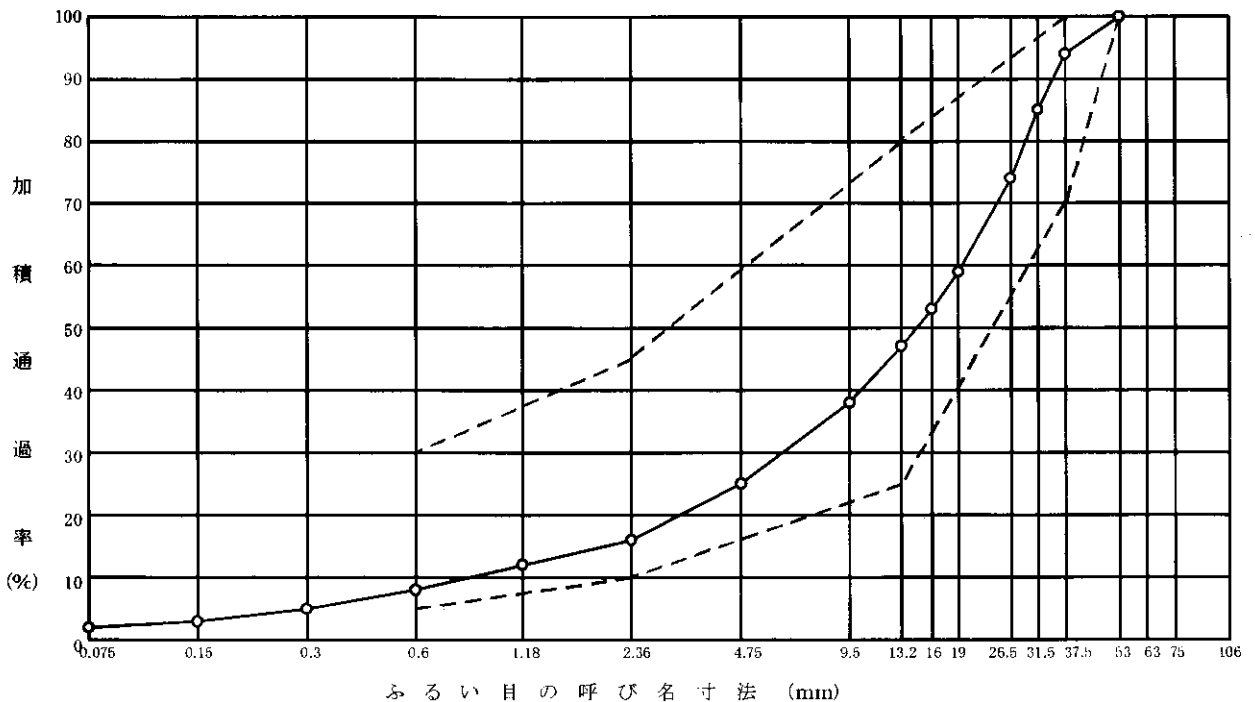

写 真 集

No \_\_\_\_\_



路盤材材料試験

試料採取状況

試料名:現場内採取

No \_\_\_\_\_



路盤材材料試験

骨材のふるい分け試験

試料名:現場内採取

No \_\_\_\_\_



路盤材材料試験

骨材の洗い試験

試料名:現場内採取
